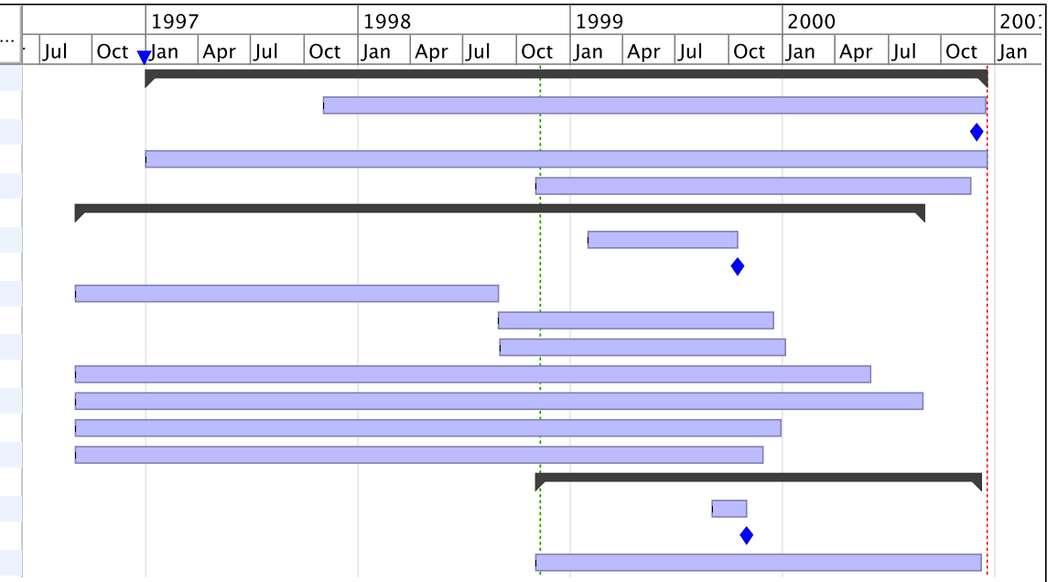	Info	Task Name	Duration	Start	Finish	Pr...	Reso...
1		**RED HILLS POWER PLANT**	**1036d**	**Jan 1, 1997 8:00 AM**	**Dec 19, 2000 5:00 PM**		
2		POWER PLANT DESIGN AND CONSTRUCTION	817d	Nov 3, 1997 8:00 AM	Dec 18, 2000 5:00 PM		
3		COMMERCIAL OPERATION	0d	Dec 1, 2000 8:00 AM	Dec 1, 2000 5:00 PM		
4		LIGNITE MINE DESIGN AND CONSTRUCTION	1036d	Jan 1, 1997 8:00 AM	Dec 19, 2000 5:00 PM		
5		LIGNITE MINE ACTIVITY	538d	Nov 2, 1998 8:00 AM	Nov 21, 2000 5:00 PM		
6		**PUBLIC INFRASTRUCTURE**	**1046d**	**Sep 2, 1996 8:00 AM**	**Sep 1, 2000 5:00 PM**		
7		GAS PIPELINE DESIGN AND CONSTRUCTION	186d	Feb 1, 1999 8:00 AM	Oct 16, 1999 5:00 PM		
8		GAS FLOW	0d	Oct 16, 1999 8:00 AM	Oct 16, 1999 5:00 PM		
9		PENSACOLA ROAD RELOCATION	522d	Sep 2, 1996 8:00 AM	Sep 1, 1998 5:00 PM		
10		POTABLE WATER SUPPLY	341d	Aug 31, 1998 8:00 AM	Dec 17, 1999 5:00 PM		
11		PROCESS WATER SUPPLY	355d	Sep 1, 1998 8:00 AM	Jan 7, 2000 5:00 PM		
12		WASTEWATER TREATMENT	980d	Sep 2, 1996 8:00 AM	Jun 1, 2000 5:00 PM		
13		LAND DEVELOPMENT AND IMPROVEMENTS	1046d	Sep 2, 1996 8:00 AM	Sep 1, 2000 5:00 PM		
14		LIMESTONE PREPARATION SYSTEM	871d	Sep 2, 1996 8:00 AM	Dec 31, 1999 5:00 PM		
15		ASH MANAGEMENT UNIT	849d	Sep 2, 1996 8:00 AM	Dec 1, 1999 5:00 PM		
16		**ECOPLEX TENANT RECRUITMENT**	**551d**	**Nov 2, 1998 8:00 AM**	**Dec 8, 2000 5:00 PM**		
17		GREENHOUSE CONSTRUCTION	45d	Sep 1, 1999 8:00 AM	Nov 1, 1999 5:00 PM		
18		BEGIN GREENHOUSE PRODUCTION	0d	Nov 1, 1999 8:00 AM	Nov 1, 1999 5:00 PM		
19		ECOPLEX PROMOTION AND TENANT RECRUITMENT	551d	Nov 2, 1998 8:00 AM	Dec 8, 2000 5:00 PM
